


ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
 財団法人 宮崎県環境整備公社 建設課
 TEL 0985-30-6511
 不動産テラ・西條・五幸特定建設工事共同企業体
 TEL 0985-73-8301

現在、本体補強工を進めております。
 1-1水槽では、縦桁部のコンクリート打設が終わり、増壁部の鉄筋組立を行っております。
 1-2水槽では、底版コンクリート打設が終了し、縦桁部のコンクリート打設を予定するとともに、増壁部の鉄筋組立に取りかかっております。
 2水槽では、底版の一部について、コンクリート打設準備を行いながら、鉄筋組立等の作業を並行して行っております。暑い季節となりましたが、出来るだけ早い完成と、なによりもしっかりした、調整池をつくりあげるべく、日々の工事を行っております。

7月末の進捗率 55.4%

今月の作業状況

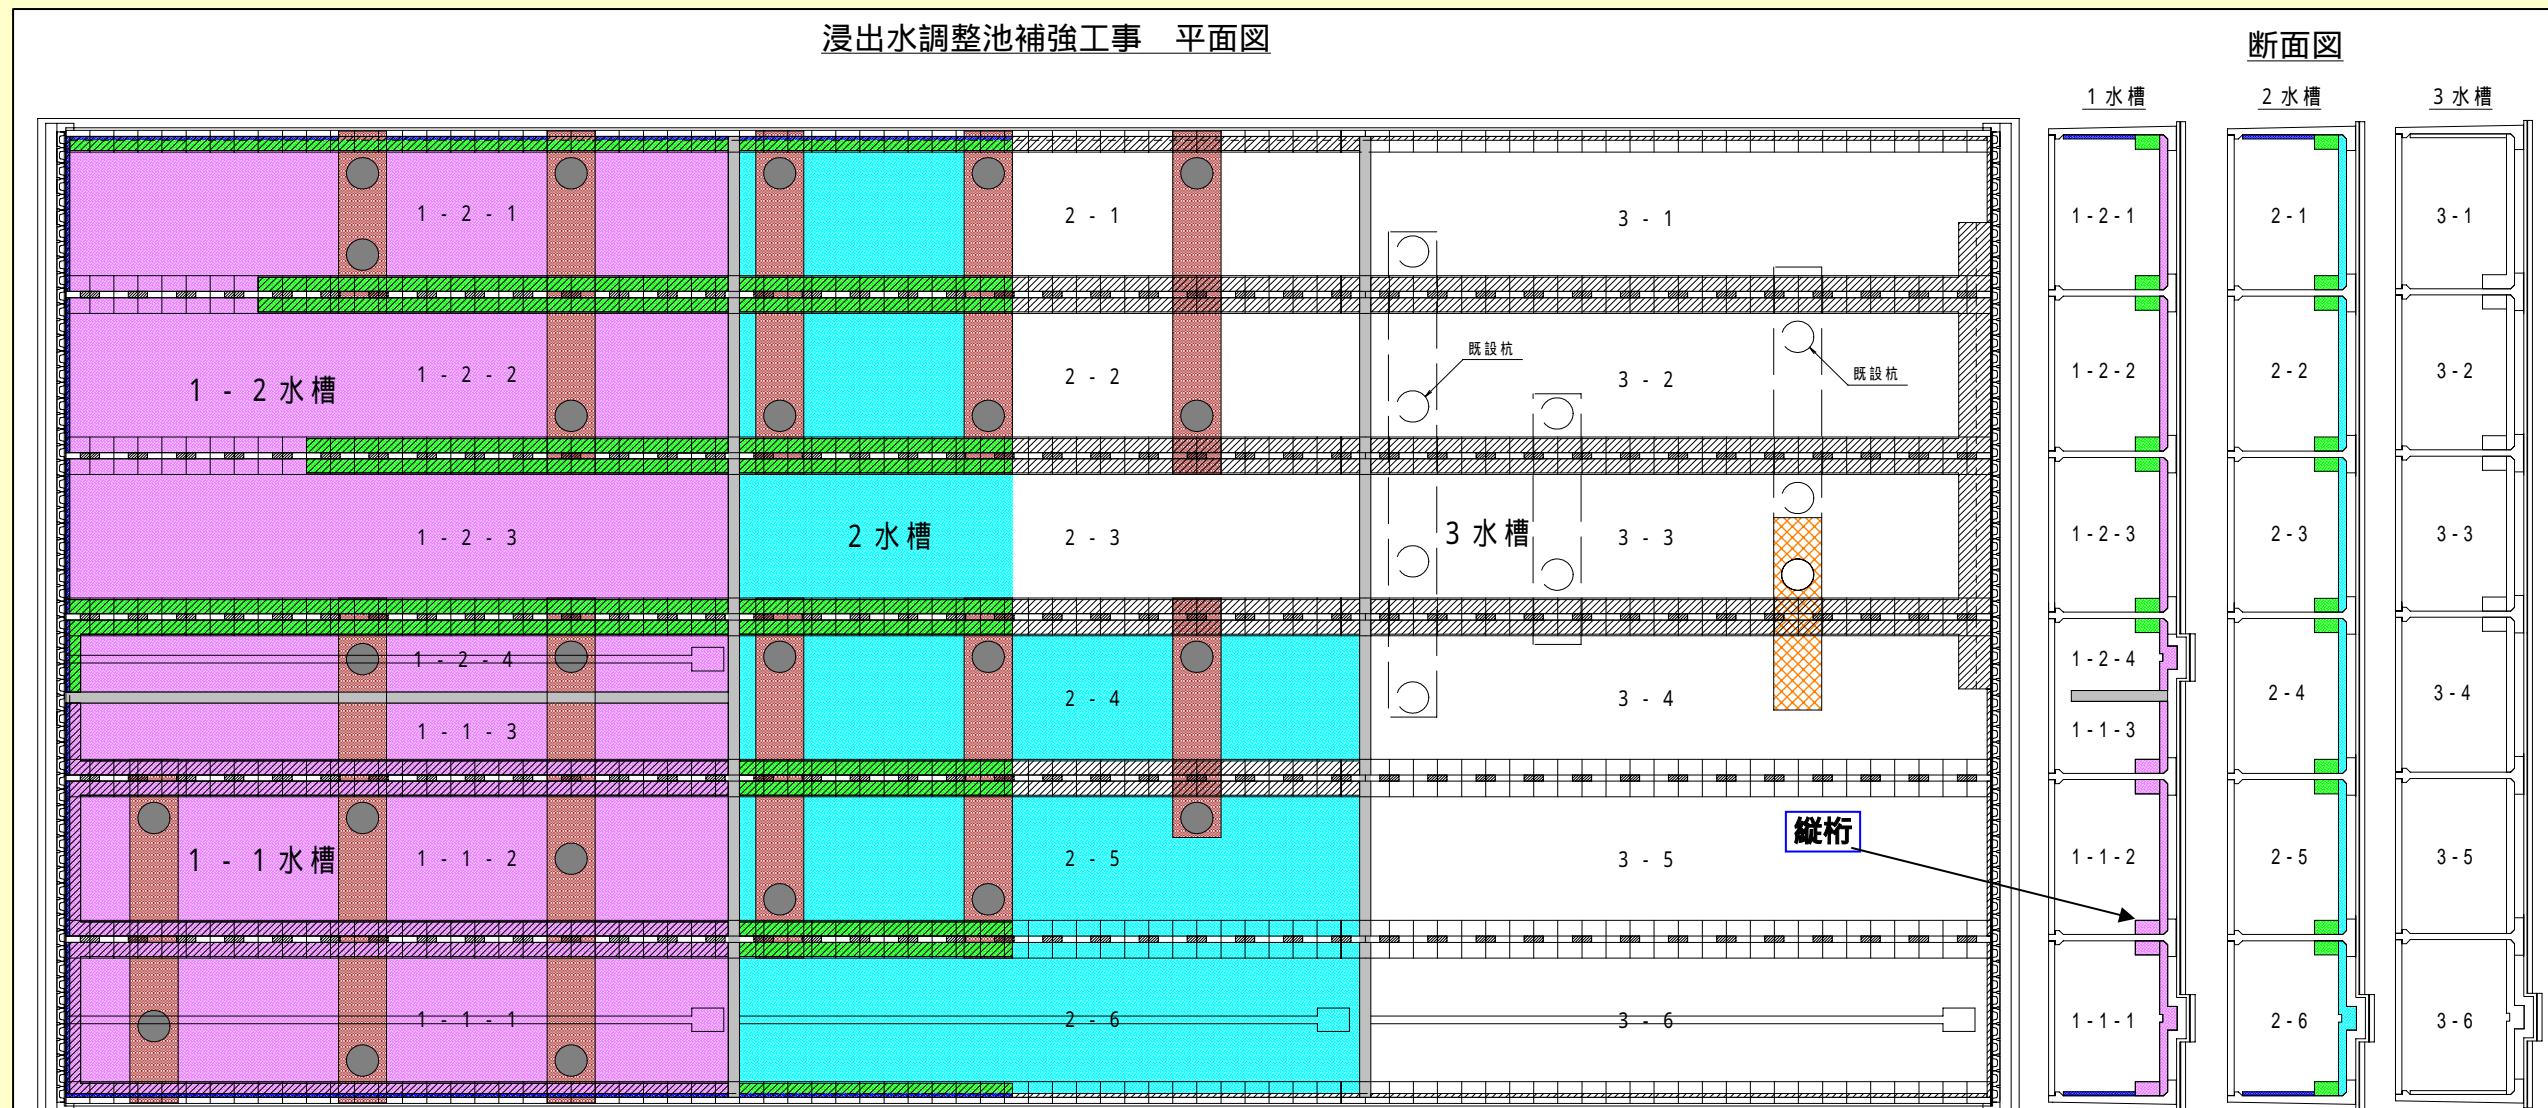

7月26日現在の進捗状況

- | | | |
|----------|-----------------|------------------|
| 基礎杭の状況 | ● 1水槽・2水槽完了：24本 | ○ 未施工箇所：1本（第3水槽） |
| 地中梁の状況 | ■ 1水槽・2水槽完了：11基 | ▨ 未施工箇所：1基（第3水槽） |
| 本体補強工の状況 | ■ 底版鉄筋組立中及び完了 | ■ 底版コンクリート打設完了 |
| | ■ 縦桁鉄筋組立中及び完了 | ■ 縦桁コンクリート打設完了 |
| | ■ 増壁鉄筋組立中及び完了 | |

